

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

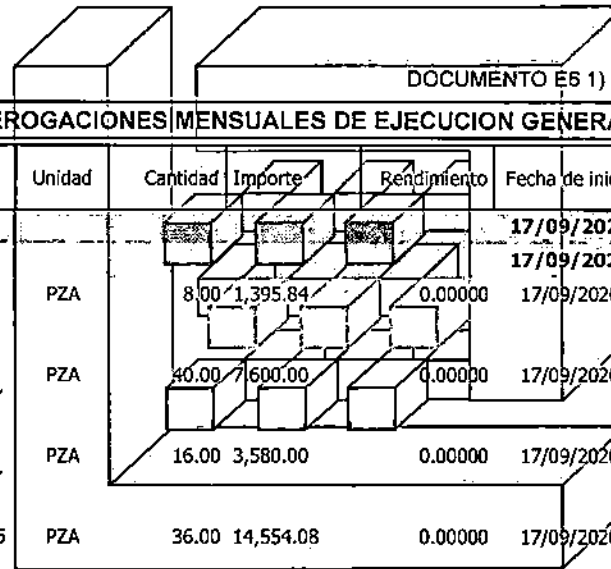


PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Rendimiento, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/sep./2020, 01/oct./2020, 30/sep./2020, 31/oct./2020, Total. Rows include items 1-6 for electrical infrastructure.

A FAVOR DEL

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

447



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020	01/oct./2020	Total	
								30/sep./2020	31/oct./2020		
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00	32,416.44	0.00000	17/09/2020	30/09/2020			\$32,416.44	\$32,416.44
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	935.61	0.00000	17/09/2020	30/09/2020			\$935.61	\$935.61
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	12,162.93	0.00000	17/09/2020	30/09/2020			\$12,162.93	\$12,162.93
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	13,388.44	0.00000	17/09/2020	30/09/2020			\$13,388.44	\$13,388.44
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	36.00	3,697.20	0.00000	17/09/2020	30/09/2020			\$3,697.20	\$3,697.20
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	56.00	10,799.04	0.00000	17/09/2020	30/09/2020			\$10,799.04	\$10,799.04
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	1,869.12	0.00000	17/09/2020	30/09/2020			\$1,869.12	\$1,869.12

~~ATENTAMENTE~~

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

448



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	170,927.20	0.00000	17/09/2020	30/09/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$170,927.20
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	369,431.02	0.00000	17/09/2020	30/09/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$369,431.02
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	6,301.75	0.00000	17/09/2020	30/09/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$6,301.75
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.00	1,130.22	0.00000	17/09/2020	30/09/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$1,130.22
LÍNEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION						30/09/2020	09/10/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	8,281.20	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$1,035.15
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	76.00	6,925.88	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$865.74
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	6,487.56	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$810.94

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR UNICO

449



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

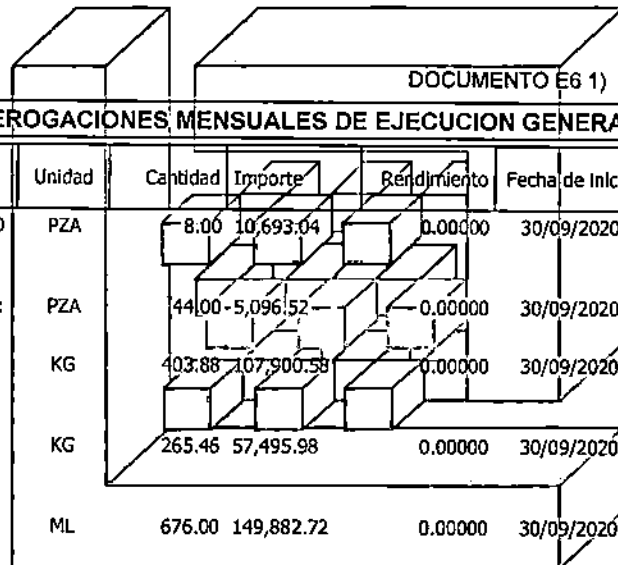


PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Table with 12 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Rendimiento, Fecha de Inicio, Fecha de término, 01/sep./2020, 01/oct./2020, Total. Rows 21-27 detailing electrical work items like cable and hardware.

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

450



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	66.00	3,853.74	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	\$481.72	\$3,372.02	\$3,853.74
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	1,452.80	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	\$181.60	\$1,271.20	\$1,452.80
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00	4,268.56	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	\$533.57	\$3,734.99	\$4,268.56
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	3,645.00	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	\$455.62	\$3,189.38	\$3,645.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	49.00	7,251.02	0.00000	30/09/2020	09/10/2020	\$905.64	\$6,345.38	\$7,251.02
	RETENIDAS					25/09/2020	02/10/2020			
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	1,558.76	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$1,037.69	\$521.07	\$1,558.76
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	105.50	28,165.34	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$18,776.00	\$9,389.34	\$28,165.34

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

95/



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

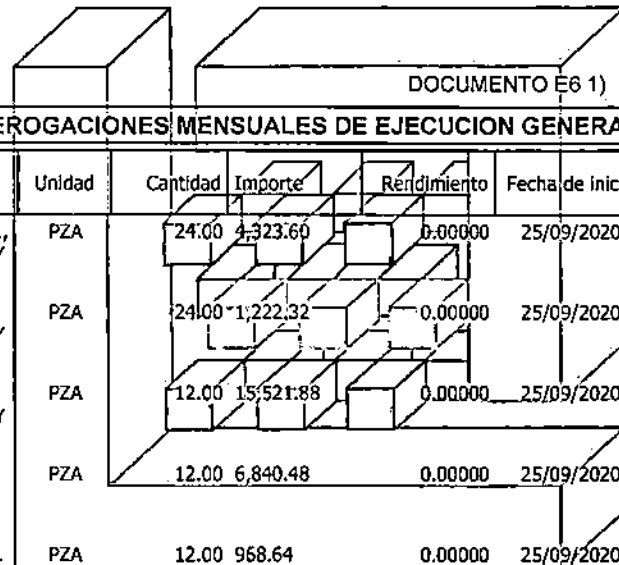

DOCUMENTO E6 1)


PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	4,323.60	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$2,882.40	\$1,441.20	\$4,323.60
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	1,222.32	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$814.88	\$407.44	\$1,222.32
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	15,521.88	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$10,347.92	\$5,173.96	\$15,521.88
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	6,840.48	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$4,560.32	\$2,280.16	\$6,840.48
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	968.64	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$645.76	\$322.88	\$968.64
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	419.84	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$279.19	\$140.65	\$419.84
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" , INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	707.12	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$466.70	\$240.42	\$707.12

A T E N T A M E N T E

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

452



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	324.92	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$214.45	\$110.47	\$324.92
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	7,080.24	0.00000	25/09/2020	02/10/2020	\$4,720.16	\$2,360.08	\$7,080.24
TIERRAS						09/10/2020	15/10/2020			
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	12,783.15	0.00000	09/10/2020	15/10/2020		\$12,783.15	\$12,783.15
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	2,898.63	0.00000	09/10/2020	15/10/2020		\$2,898.63	\$2,898.63
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	4,818.78	0.00000	09/10/2020	15/10/2020		\$4,818.78	\$4,818.78
TRANSFORMADORES						28/09/2020	07/10/2020			
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	1,675.26	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$628.22	\$1,047.04	\$1,675.26

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

453



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de Inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	523.44	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$195.42	\$328.02	\$523.44
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	12,783.15	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$4,791.31	\$7,991.84	\$12,783.15
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	180.00	17,965.80	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$6,737.18	\$11,228.62	\$17,965.80
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	9,731.34	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$3,649.25	\$6,082.09	\$9,731.34
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.00	5,201.70	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$1,949.40	\$3,252.30	\$5,201.70
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	2,898.63	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$1,085.38	\$1,813.25	\$2,898.63
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	2,634.30	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$987.86	\$1,646.44	\$2,634.30

ATENTAMENTE

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

958



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30



DOCUMENTO E6 1)


PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Table with 11 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Rendimiento, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/sep./2020 30/sep./2020, 01/oct./2020 31/oct./2020, Total. Rows 55-61 detailing electrical work items like connectors, fuses, and transformers.

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

455



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020	01/oct./2020	Total
								30/sep./2020	31/oct./2020	
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	552.24	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$207.09	\$345.15	\$552.24
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	2,200.38	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$825.14	\$1,375.24	\$2,200.38
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	520.26	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$195.10	\$325.16	\$520.26
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	4,818.78	0.00000	28/09/2020	07/10/2020	\$1,804.37	\$3,014.41	\$4,818.78
ALUMBRADO PUBLICO						12/10/2020	16/10/2020			
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	112,999.04	0.00000	12/10/2020	16/10/2020		\$112,999.04	\$112,999.04
ACOMETIDAS						05/10/2020	16/10/2020			
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	378.70	21,881.29	0.00000	05/10/2020	16/10/2020		\$21,881.29	\$21,881.29

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

456



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/SOPyDU/AMP-ELE/IR-024/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

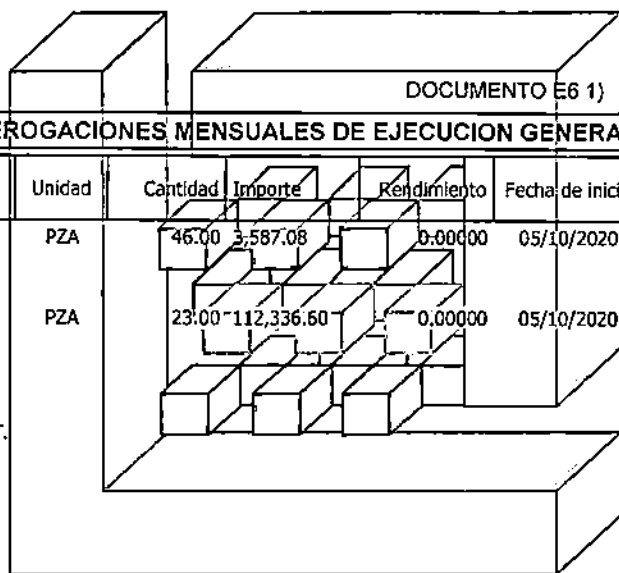

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Rendimiento	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020	01/oct./2020	Total
								30/sep./2020	31/oct./2020	
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	46.00	3,587.08	0.00000	05/10/2020	16/10/2020		\$3,587.08	\$3,587.08
69	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, VARILLA COPERWELLD DE 1.50 MT., CABLE ELÉCTRICO THW CAL 8.	PZA	23.00	112,336.60	0.00000	05/10/2020	16/10/2020		\$112,336.60	\$112,336.60
Importe parcial								\$856,529.35	\$780,509.43	
Importe acumulado								\$856,529.35	\$1,637,038.78	

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

457
