


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$161,921,000.19

Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	Subprograma	Fecha de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Tipo de Obra	Descripción	Fac. In. Res.	Fac. Ter. Res.	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances								
				Total	R. del Fondo						Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Res.	U. Medida	Capacidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
336/0001/43530	18	11	A	033	2016-08-13	2016-07-12	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO / BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	652,212.00	652,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,836.45	648,836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19	10.00	3	POBLADO	1	243	100	99.48		
330/0002/43135	16	11	B	217	2016-06-13	2016-07-12	CONTRATO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO / BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	142,239.00	842,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,432.31	836,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	1,216.00	3	POBLADO	1	659	100	99.10		
3309/0003/43176	15	11	B	258	2016-06-13	2016-07-12	CONTRATO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAÑADA DEL SAUCCO / CAÑADA DEL SAUCCO	499,914.00	499,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,817.12	491,817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	805.00	3	POBLADO	1	241	100	99.36		
3400/0004/43177	15	11	B	217	2016-06-13	2016-07-12	CONTRATO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC / BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,804.87	973,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	1,910.00	3	POBLADO	1	1,610	95	97.39		
3834/0005/320487	15	11	B	258	2016-06-13	2016-09-12	CONTRATO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO / SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO	4,530,590.39	4,530,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529,767.20	4,529,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	2,394.95	3	POBLADO	1	1,638	93	98.98		
3835/0006/43589	18	11	A	033	2016-06-13	2016-07-12	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS / BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS	880,230.00	880,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,371.87	974,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	11.00	3	POBLADO	1	118	89	98.41	
3835/0007/43755	18	11	A	033	2016-06-20	2016-07-19	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN FABRICA CONCEPCION / FABRICA CONCEPCION	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,789.27	995,789.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	14.00	3	POBLADO	1	2,071	100	98.58	
3838/0009/43746	18	11	A	033	2016-06-13	2016-07-12	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,673.84	1,062,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	16.00	3	POBLADO	1	603	95	98.60	
3839/0010/43780	18	11	A	033	2016-06-20	2016-07-19	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO / LLANO SAN JUAN PALO SECO, BARRIO EL	400,949.00	400,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,313.41	397,313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	6.00	3	POBLADO	1	349	100	99.09
3840/0011/276855	18	11	A	033	2016-06-20	2016-07-19	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN MITA DEL CEDRO DOS / MITA DEL CEDRO DOS	672,011.97	672,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,177.12	630,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	12.00	3	POBLADO	1	1,001	95	93.77	
3841/0012/44454	18	11	A	033	2016-07-04	2016-08-02	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR / PORVENIR, EL	670,964.00	670,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,167.27	668,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	14.00	3	POBLADO	1	594	100	99.68	
3842/0013/43973	18	11	A	033	2016-06-20	2016-07-19	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS / EL PUENTE, BARRIO LAS ROSAS	679,007.00	679,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,496.28	674,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	12.00	3	POBLADO	1	501	89	98.33	
3843/0014/44028	18	11	A	033	2016-06-20	2016-08-18	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN RAMAJE EL DEPOSITO EJIDO / RAMAJE EL DEPOSITO EJIDO	1,461,476.00	1,461,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,647.02	1,456,647.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	24.00	3	POBLADO	1	1,272	93	99.67	
3844/0015/44803	15	11	B	217	2016-07-04	2016-08-02	CONTRATO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ROSAS / ROSAS, LAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,314.12	988,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	2,010.00	3	POBLADO	1	1,763	100	98.83		
3845/0016/43987	18	11	A	033	2016-06-20	2016-07-19	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN LAS ROSAS / ROSAS, LAS	1,025,535.00	1,025,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,051.81	1,021,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	20.00	3	POBLADO	1	1,763	93	98.55	
3846/0017/44003	18	11	A	033	2016-06-20	2016-07-19	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS (SAN JOSE LAMILLAS) / BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS	685,790.00	685,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,694.64	681,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	7.00	3	POBLADO	1	1,768	100	99.58	
3847/0018/44031	18	11	A	033	2016-06-20	2016-08-18	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN SAN JOAQUIN LAMILLAS CENTRO / SAN JOAQUIN LAMILLAS CENTRO	2,032,529.00	2,032,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,333.47	2,028,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	63.00	3	POBLADO	1	1,769	93	99.78	
3848/0019/44544	18	11	A	033	2016-07-04	2016-08-02	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ DEL RINCÓN / SANTA CRUZ DEL RINCÓN	770,927.00	770,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,335.30	755,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	18.00	3	POBLADO	1	671	100	97.07	
3849/0020/44950	15	11	B	258	2016-07-04	2016-08-02	CONTRATO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE / SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	693,844.00	693,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,867.60	691,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	996.40	3	POBLADO	1	604	93	99.70	
3850/0021/44965	15	11	B	217	2016-06-13	2016-07-12	CONTRATO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRINIDAD CONCEPCION / TRINIDAD CONCEPCION, LA	1,095,094.00	1,095,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,423.91	1,092,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	2,085.00	3	POBLADO	1	954	100	99.59	
3851/0022/45217	15	11	B	258	2016-07-04	2016-08-02	CONTRATO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA MESA LA LAGUNITA / BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	521,631.00	521,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,835.27	510,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	546.00	3	POBLADO	1	367	100	99.65	
3852/0023/44512	18	11	A	033	2016-08-20	2016-07-19	CONTRATO	ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS ROSAS GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	1,074,448.00	1,074,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,351.77	973,351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	15.00	3	POBLADO	1	500	100	80.69	
4066/0026/43213	15	11	B	258	2016-06-13	2016-08-11	CONTRATO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CANOGAS GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO CANOGAS GUARDA LA LAGUNITA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,442.07	1,997,442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	1,730.60	3	POBLADO	1	1,639	100	98.87	

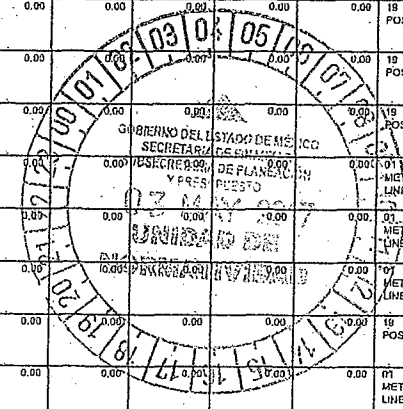


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$181,921,000.19

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. In. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada					Inversión Ejecida					Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Núcleo	Obra/Localidad	Mod. EjeC	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	U. Medida	Aprobada	Aprob. Resol.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fs.	Fin.
4047/0017 275300	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL RINCÓN EJIDO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	CONTRATO	2016-06-13	2016-08-11	1,061,524.11	1,061,524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,524.11	1,061,524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,871.21		3 POBLADO	1	2,303	100	100.00
4049/0028 275462	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL UJADERO LA MESA / BARRIO EL UJADERO LA MESA	CONTRATO	2016-08-20	2016-07-19	1,107,590.15	1,107,590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,590.15	1,107,590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	10.00		3 POBLADO	1	833	100	100.00
4050/0028 253849	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO / BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-08-13	2016-07-12	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,064.43	492,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	724	100	89.42
4051/0038 83818	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS LOBOS SEGUNDA SECCION / LOS LOBOS SEGUNDA SECCION, LOS	CONTRATO	2016-08-13	2016-07-12	1,142,053.89	1,142,053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,488.82	1,135,488.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,241.00		3 POBLADO	1	684	100	89.42
4052/0031 44938	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES / SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	CONTRATO	2016-06-13	2016-07-12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	706.02		3 POBLADO	1	426	100	100.00
405W/0035 44594	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN LA TRINIDAD CONCEPCION / TRINIDAD CONCEPCION, LA	CONTRATO	2016-07-04	2016-08-02	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,802.78	497,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	9.00		3 POBLADO	1	954	100	89.58
406W/0038 275520	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO / BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-07-04	2016-08-02	572,358.07	572,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,358.07	572,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	103	100	100.00
406Z/0038 275340	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	1,216,620.34	1,216,620.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,620.34	1,216,620.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,599.00		3 POBLADO	1	892	100	100.00
4064/0038 44910	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO) / LA VENTA (BARRIO EL SALTO)	CONTRATO	2016-07-04	2016-08-02	883,482.00	883,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,876.72	880,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	995.00		3 POBLADO	1	858	100	99.74
4065/0040 01537	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA EN BARRIO CAÑAS GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO CAÑAS GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	921,855.00	921,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,639.75	920,639.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	464.80		5 ALUMNO	1	2,108	100	89.86
4068/0041 276264	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN LA TRAMPA CHICA / TRAMPA CHICA, LA	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	808,524.56	808,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,524.56	808,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	12.00		3 POBLADO	1	476	100	100.00
4069/0042 44551	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC / SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	1,151,246.00	1,151,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,015.65	1,148,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	18.00		3 POBLADO	1	1,002	100	89.80
4070/0043 44584	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN RANCHERIA DE LOS DOLORES / RANCHERIA DE LOS DOLORES	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	607,287.00	607,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,620.39	605,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	11.00		3 POBLADO	1	311	100	99.70
4072/0044 45970	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CASABLANCA EXDO / BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	319,370.00	319,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,392.97	309,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	234.00		5 ALUMNO	1	240	100	88.88
4073/0045 224483	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	226 SECUNDARIA (SANITARIO)	CONSTRUCCION DE MOGULO DE BAÑOS EN FALDA LOMA / FALDA LOMA	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	412,882.82	412,882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,661.12	410,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.08		5 ALUMNO	1	84	100	99.51
4075/0046 44667	15 AYS	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINITA DEL CEDRO DOS / MINITA DEL CEDRO DOS	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,302.93	497,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,250.00		3 POBLADO	1	1,091	100	99.46
4076/0047 46245	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO Y YONDECE DEL CEDRO	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	672,892.00	672,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,948.57	670,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	388.24		5 ALUMNO	1	1,456	100	89.72
4077/0049 44477	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LAS ROSAS / RANCHERIA LAS ROSAS (RANCHERIA LA ROSA)	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	582,008.00	582,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,157.11	580,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	10.00		3 POBLADO	1	289	100	99.68
407W/0049 256371	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN ROSA DE LA PALMA / ROSA DE LA PALMA	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	848,823.84	848,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,471.70	847,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	389.40		5 ALUMNO	1	189	100	99.84



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$181,921,000.19

Datos de la Obra y/o Acción					Rec. In. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Metas Totales		Beneficiarios			Avances										
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicia	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Rec. In. Real	Rec. Tar. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
4050/0050-45359	05	EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS (CASA BLANCA) / CIENEGUILLAS (CASA BLANCA)	CONTRATO	2016-08-01	2016-08-30	383,828.19	383,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,233.27	383,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	272.40	0	5 ALUMNO	1	227	100	90.33		
4460/0051-45051	15	AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2016-09-01	2016-09-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,169.62	998,169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,190.00	3	POBLADO	1	692	100	99.82	
4481/0052-44052	17	URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	592,105.27	592,105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,602.11	590,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	933.41	3	POBLADO	1	600	100	99.74	
4462/0053-45472	05	EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CONSUELO / EJIDO EL CONSUELO)	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	312,476.00	312,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,385.94	311,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	280.11	5	ALUMNO	1	227	100	99.65	
4463/0054-275581	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	625,071.39	625,071.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,071.39	625,071.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	8.00	3	POBLADO	1	120	100	100.00	
4464/0055-44417	17	URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	592,105.27	592,105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,602.11	590,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	933.41	3	POBLADO	1	600	100	99.74
4465/0056-45347	05	EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHSPA / CHSPA, LA)	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	657,176.00	657,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,136.55	655,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	529.90	5	ALUMNO	1	572	95	99.68
4466/0057-82120	05	EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	650,097.00	650,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,231.92	626,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	528.00	5	ALUMNO	1	1,875	100	99.33
4467/0058-276745	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	1,224,254.04	1,224,254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,254.04	1,224,254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	12.00	3	POBLADO	1	662	100	100.00	
4468/0059-278802	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	1,110,686.04	1,110,686.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,686.04	1,110,686.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	15.00	3	POBLADO	1	1,757	100	100.00	
4469/0060-275393	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	929,503.02	929,503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,503.02	929,503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 POSTE	12.00	3	POBLADO	1	670	100	100.00	
4472/0061-45093	15	AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2016-09-05	2016-10-04	536,879.00	536,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,819.09	534,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,048.20	3	POBLADO	1	119	100	99.68
4410/0064-93095	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	1,638	100	100.00
4411/0065-83758	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	3	POBLADO	1	814	100	100.00
4412/0068-87762	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	810	100	100.00
4413/0071-83760	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	418	100	100.00
4414/0069-83767	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	125	100	100.00
4415/0069-93143	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	242	100	100.00
4416/0070-83903	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	500	100	100.00
4417/0071-83922	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	1,136	100	100.00
4418/0072-93034	19	VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3	POBLADO	1	467	100	100.00

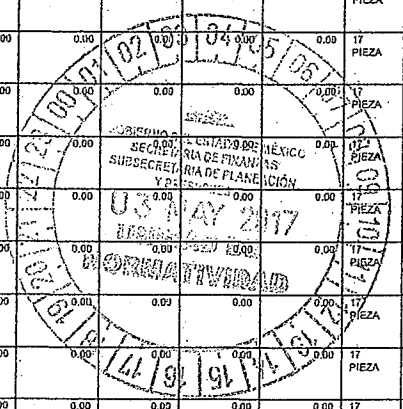



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$161,921,000.19

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. In. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada					Inversión Ejecida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Subc.	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
4819/ 0073 220803	10 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO / BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	6,815.61	6,815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.61	6,815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	457	100	100.00
4820/ 0074 93042	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	389	100	100.00
4821/ 0076 220610	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	389	100	100.00
4822/ 0078 93286	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO / BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	519	100	100.00
4823/ 0077 220911	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO / BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-11-31	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLAD O	1	519	100	100.00
4824/ 0078 02295	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO / BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	68	100	100.00
4825/ 0079 220012	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO / BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	69	100	100.00
4826/ 0080 93303	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO / BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	532	100	100.00
4827/ 0081 221764	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO / BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLAD O	1	532	100	100.00
4828/ 0082 93305	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO / BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLAD O	1	724	100	100.00
4829/ 0083 220915	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO / BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	724	100	100.00
4831/ 0084 93169	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO BARRIOLOS CEDROS	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	953	100	100.00
4833/ 0085 220916	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO LOS CEDROS EN SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO BARRIOLOS CEDROS	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	953	100	100.00
4834/ 0086 93309	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	536	100	100.00
4837/ 0087 220918	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	536	100	100.00
4840/ 0088 93326	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BUENAVISTA CASABLANCA EJIDO / BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	278	100	100.00
4841/ 0089 221946	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BUENAVISTA CASABLANCA EJIDO / BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	278	100	100.00
4845/ 0090 93190	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO / EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	149	100	100.00
4848/ 0091 220921	18 VV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO / EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLAD O	1	149	100	100.00
4848/ 0092 220927	18 VV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS CANCHAS SAN FELIPE DE JESUS / BARRIO CANCHAS SAN FELIPE DE JESUS	CONTRAT O	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLAD O	1	213	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$161,921,000.19

Datos de la Obra y Acción						Fac. Int. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejecutada					Monto Totales			Beneficiarios			Avances																
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejes	Fac. Int. Real	Fac. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	U. Medida Ejec.	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real	U. Medida Ejec. Real							
484W/0063/220952	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GARATACHEA / GARATACHEA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	116	100	100.00												
4851/0094/03339	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CAÑADA DEL SAUCO / CAÑADA DEL SAUCO	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	241	100	100.00												
4852/0095/220963	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CAÑADA DEL SAUCO / CAÑADA DEL SAUCO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	241	100	100.00												
4854/0088/93357	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CEDRO DE LA MANZANA / CEDRO DE LA MANZANA	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	1,389	100	100.00												
4855/0097/220958	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CEDRO DE LA MANZANA / CEDRO DE LA MANZANA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	1,389	100	100.00												
4856/0098/03360	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL CERRITO PUEBLO NUEVO / EL CERRITO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	378	100	100.00												
4857/0099/220972	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL CERRITO PUEBLO NUEVO / EL CERRITO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	378	100	100.00												
4858/0100/93362	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CEVATI / CEVATI	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	96	100	100.00												
4859/0101/220973	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CEVATI / CEVATI	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	96	100	100.00												
4851/0102/93366	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA CHISPA / CHISPA, LA	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	572	100	100.00												
4862/0103/220980	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA CHISPA / CHISPA, LA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	572	100	100.00												
4863/0104/220987	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CIENEGUILLAS (CASA BLANCA) / CIENEGUILLAS (CASA BLANCA)	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	227	100	100.00												
4865/0105/221010	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CIENEGUILLAS (CASA BLANCA) / CIENEGUILLAS (CASA BLANCA)	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	227	100	100.00												
4866/0106/221017	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN COLONIA BENITO JUAREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE / COLONIA BENITO JUAREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		2 COLONIA	1	698	100	100.00												
4869/0107/221024	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN COLONIA BENITO JUAREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE / COLONIA BENITO JUAREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		2 COLONIA	1	698	100	100.00												
4869/0108/221032	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA / COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	2,005.30	2,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.30	2,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	178	100	100.00												
4870/0109/221039	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA / COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		2 COLONIA	1	178	100	100.00												
4871/0110/221040	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CONCEPCION LA VENTA / CONCEPCION LA VENTA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	1,209	100	100.00												
4872/0111/221046	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CONCEPCION DEL MONTE / CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	1,192	100	100.00												
4873/0112/221053	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO / LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	609	100	100.00												
4874/0113/221778	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO / EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	5,784,930	100	100.00												
4875/0114/221802	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA CURVA EL DEPOSITO / LA CURVA EL DEPOSITO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	255	100	100.00												



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$161,921,000.19

Reporte de Ejercicio Acumulado


Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Metas Totales		Beneficiarios			Avances										
Control	Secor	Programa	Subprograma	Inicia	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Res.	Fac. Ter. Res.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Res.	U. Medida	Capacidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
4876/0115/221069	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN JOSE DEL RINCÓN EJIDO / EJIDO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	2,303	100	100.00
4877/0116/221102	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SANACOCHE CENTRO / SANACOCHE CENTRO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	64	100	100.00
4878/0117/221112	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EJIDO EL CONSUELO / EJIDO EL CONSUELO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	272	100	100.00
4879/0118/221128	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EJIDO LA SOLEDAD / EJIDO LA SOLEDAD	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	2,378	100	100.00
4880/0119/221133	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA ESPERANZA / ESPERANZA, LA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	652	100	100.00
4881/0121/221141	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN FABRICA CONCEPCION / FABRICA CONCEPCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	2,071	100	100.00
4882/0121/221192	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN FABRICA PUEBLO NUEVO / FABRICA PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	833	100	100.00
4883/0122/221174	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN FABRICA PUEBLO NUEVO MONTE-ALTO / FABRICA PUEBLO NUEVO MONTE ALTO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00	3 POBLADO	1	249	100	100.00
4884/0123/221813	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN FALDA LOMA / FALDA LOMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	84	100	100.00
4885/0124/221183	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUADALUPE BUENAVISTA / GUADALUPE BUENAVISTA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	1,016	100	100.00
4886/0125/221191	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUADALUPE CHICO / GUADALUPE CHICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	835	100	100.00
4887/0128/221187	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUADALUPE DEL PEDREGAL / GUADALUPE DEL PEDREGAL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	383	100	100.00
4888/0127/221207	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA / GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	533	100	100.00
4889/0128/222800	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUADALUPE LAS CABRAS / GUADALUPE LAS CABRAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	228	100	100.00
4890/0129/221219	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUARDA DE GUADALUPE / GUARDA DE GUADALUPE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	782	100	100.00
4891/0130/221233	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO CANOA GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	2,543	100	100.00
4892/0131/221242	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	753	100	100.00
4893/0132/221263	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO / GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	328	100	100.00
4894/0133/221283	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	603	100	100.00
4895/0134/221332	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL HUIZACHE / HUIZACHE, EL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	803	100	100.00
4896/0135/221339	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN JESÚS CARRANZA / JESÚS CARRANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	527	100	100.00
4897/0136/221350	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO EL LLANERO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL LLANERO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	433	100	100.00
4898/0137/222910	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS / BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00	3 POBLADO	1	493	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$161,921,000.19

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. In. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Locidad	Mod. Ejec.	Fac. In. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Res.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fla.	Fin.
4899/0138 221353	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO / LLANO SAN JUAN PALO SECO, BARRIO EL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	349	100	100.00
4900/0139 221375	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LOS LOBOS CENTRO / LOS LOBOS CENTRO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	1,779	100	100.00
4901/0140 221839	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LOS LOBOS SEGUNDA SECCION / LOBOS SEGUNDA SECCION, LOS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	994	100	100.00
4902/0141 221646	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LOMA DEL RANCHO / LOMA DEL RANCHO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	587	100	100.00
4903/0142 221667	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA MESA / MESA, LA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	1,675	100	100.00
4904/0143 221657	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MINITA DEL CEDRO DOS / MINITA DEL CEDRO DOS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	1,001	100	100.00
4905/0144 221680	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO CHIVATI LA MESA / BARRIO CHIVATI LA MESA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	428	100	100.00
4906/0145 221893	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO / BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	231	100	100.00
4907/0148 221890	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN PALO AMARILLO / PALO AMARILLO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	10,871.49	10,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871.49	10,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	583	100	100.00
4908/0147 111513	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN RAMAJE EL DEPOSITO EJIDO / RAMAJE EL DEPOSITO EJIDO	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	1,272	100	100.00
4909/0148 221893	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN RAMAJE EL DEPOSITO EJIDO / RAMAJE EL DEPOSITO EJIDO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	1,272	100	100.00
4910/0149 221937	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE / BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	405	100	100.00
4911/0160 83884	18 VIV	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN ROSA DE LA PALMA / ROSA DE LA PALMA	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	488	100	100.00
4912/0161 87750	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS ROSAS / ROSAS, LAS	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	1,763	100	100.00
4913/0152 221703	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS ROSAS / ROSAS, LAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	1,763	100	100.00
4914/0153 87784	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SABANETA QUINTANA / SABANETA (SABANETA QUINTANA)	CONTRATO	2016-06-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	370	100	100.00
4915/0154 221709	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SABANETA QUINTANA / SABANETA (SABANETA QUINTANA)	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	340.00		3 POBLADO	1	370	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$161,921,000.19

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances														
Cantón	Sector	Programa	Subprograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
4919/ 0155 87665	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO) / EL SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO)	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	858	100	100.00
4917/ 0156 221712	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO) / EL SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO)	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	858	100	100.00
4918/ 0157 87816	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO / SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	489	100	100.00
4919/ 0158 221726	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO / SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	340.00		3	POBLADO	1	489	100	100.00
4920/ 0159 87827	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	120	100	100.00
4921/ 0160 221723	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	120	100	100.00
4922/ 0161 87850	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN FELIPE DE JESUS / SAN FELIPE DE JESUS	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	662	100	100.00
4923/ 0162 221730	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN FELIPE DE JESUS / SAN FELIPE DE JESUS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	662	100	100.00
4924/ 0163 87857	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA / SAN FRANCISCO DE LA LOMA	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	807	100	100.00
4925/ 0164 223572	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA / SAN FRANCISCO DE LA LOMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	807	100	100.00
4926/ 0165 87855	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN FRANCISCO SOLO / SAN FRANCISCO SOLO	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	788	100	100.00
4927/ 0166 221739	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN FRANCISCO SOLO / SAN FRANCISCO SOLO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-30	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	788	100	100.00
4928/ 0167 81882	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN ISIDRO LA TRINIDAD / SAN ISIDRO LA TRINIDAD	CONTRATO	2016-08-27	2016-07-26	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.30	57,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	340.00		3	POBLADO	1	459	100	100.00

